

TECNOLOGICA SRL

Progetto software interconnesso 4.0

Versione 1.6 del 20/07/2022

Autore: Paolo Cellarosi, Giulia Fortini, Daniela Spighi



Sede Ravenna

Via Fratelli Lumiere 46/A
48124 Ravenna RA

Sede Forlì

Via Giovan Battista Bonucci 1
47121 Forlì FC

t. +39 0544 50 16 00

info@simatica.it
www.simatica.it

SOMMARIO

SOMMARIO	1
PREMESSA	3
FINALITA' DEL DOCUMENTO	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE	4
SITUAZIONE ATTUALE	4
AMBITI DI MIGLIORAMENTO	5
BISOGNI RILEVATI	6
REIPILOGO GESTIONE PRESENZE DOPO INCONTRO DI ANALISI DEL 07/06/2022	6
REIPILOGO RENDICONTAZIONE COMMESSA DOPO INCONTRO DI ANALISI DEL 17/06/2022	9
PROPOSTA DI SOLUZIONE	13
SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONALE	13
FASI	14
1. ANALISI DEI REQUISITI DI DETTAGLIO DAI PUNTI DI VISTA FUNZIONALE, OPERATIVO E DI SISTEMA	15
OBIETTIVO	15
RISULTATI ATTESI	15
AZIONI	15
TEAM COINVOLTO	16
OUTPUT	16
2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE	17
OBIETTIVO	17
RISULTATI ATTESI	17
AZIONI	18
TEAM COINVOLTO	18
OUTPUT	18
3. DISTRIBUZIONE DEL SISTEMA IN AMBIENTE DI PRODUZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA ALL'AVVIO, FORMAZIONE DEL PERSONALE	19
OBIETTIVO	19
RISULTATI ATTESI	19
AZIONI	20
TEAM COINVOLTO	20
OUTPUT	20
FINANZA AGEVOLATA	21
CREDITO D'IMPOSTA	21

FONDO PERDUTO	21
<u>PROIEZIONE INVESTIMENTI E RECUPERI:</u>	<u>22</u>
FINANZA AGEVOLATA	22
SOFTWARE	22
<u>CRONOPROGRAMMA (INDICATIVO):</u>	<u>24</u>

PREMESSA

FINALITA' DEL DOCUMENTO

Le finalità di questo documento sono:

- Identificazione dei requisiti di alto livello per la realizzazione di un progetto inerente alla rilevazione delle ore del personale e alla loro imputazione su commessa.
- Formulazione di una stima di tempi e costi per la realizzazione del sistema come da specifiche comprese le attività per la consulenza ed affiancamento in modo da garantire il regolare avvio in produzione.
- Verifica di come Simatica può supportare Tecnologica in un piano di transizione all'Industria 4.0 anche attraverso la ricerca di idonee linee di finanziamento pubbliche.

Il presente documento raccoglie le esigenze rilevate durante la call del 5 maggio u.s. e dell'incontro del 12 maggio successivo in cui oltre ad un affinamento delle richieste sono stati mostrati alcuni moduli funzionali della soluzione di Simatica Group.

Il documento verrà integrato ed affinato con le osservazioni del committente finché sarà possibile procedere alla definizione finale del documento di specifica dei requisiti ed alla formulazione del preventivo.

ANALISI DELLA SITUAZIONE

SITUAZIONE ATTUALE

Persone presenti durante le conversazioni e ruolo nell'organizzazione:

Nome e Cognome	Funzione	Azienda	Mail
Cinzia Leoni	Amministrazione	Technologica	cleoni@technologicasrl.com
Donato		Technologica	
Giulia Fortini	Account Manager	Simatica	giulia.fortini@simatica.it
Paolo Cellarosi	Analista	Simatica	paolo.cellarosi@simatica.it

È stata rilevata la seguente situazione:

- Il personale di Technologica è suddiviso tra tecnici e personale di ufficio. Il personale è composto da circa 50 dipendenti e 50 consulenti esterni.
- Gli operatori in officina compilano un modulo cartaceo per indicare le ore lavorate su commessa, le ore vengono caricate manualmente sulle commesse da parte del personale di ufficio.
- Il software gestionale utilizzato attualmente (Centro Paghe - Project) è utilizzato per la rilevazione presenze con marcatempo e registrazione manuale delle ore a commessa dei tecnici prese o dai bigliettini cartacei (per officina e cantiere) o dal software centro paghe per i tecnici.
- Il software attuale è fornito da Project srl di Santarcangelo (RN).
- L'innovazione digitale dell'intera azienda è rallentata dai diversi gradi di informatizzazione del personale interno.

AMBITI DI MIGLIORAMENTO

Technologica è interessata a dismettere il marcatempo e passare ad un sistema più moderno che consenta di gestire in modo snello le registrazioni delle presenze per le paghe e le registrazioni delle ore lavorate sulle commesse.

Ambiti di miglioramento prioritari identificati:

- Rilevazione delle presenze per il personale in trasferta, in officina, nei cantieri e nelle due sedi
- Rilevazione presenze dei consulenti esterni nei cantieri ed in sede
- Imputazione delle ore su commessa direttamente da parte del personale
- Quadratura automatica ore presenza e ore commessa (NOTIFICHE)
- Condivisione della documentazione
- Avvisi al personale
- Richieste autorizzazioni ferie e permessi e integrazione con presenze
- Utilizzo di tag NFC per marcare le presenze, sostituendo i vecchi marcatempo
- Pianificazione delle ore a commessa secondo le fasi di progetto e dei ruoli assegnati per migliorare l'analisi del valore della produzione, stato avanzamento lavori, e costi di commessa.
- Rilevazione ore lavorate su macchina 4.0 dal personale per comprendere tempi e quantità di utilizzo da parte degli operatori

Ambiti di miglioramento futuri:

- Schedulazione del personale nei diversi cantieri/ritiri
- Condivisione documenti di tipo tecnico (esempio: Foto del cantiere)
- Gestione di automezzi ed attrezzature su commessa, per imputazione corretta dei costi
- Gestione note spese

BISOGNI RILEVATI

Durante gli incontri il committente ha indicato come prioritari i seguenti interventi:

1. Gestione delle rilevazioni delle presenze del personale con un unico sistema utilizzabile sia presso la sede che in trasferta.
2. Rilevazione automatica delle incongruenze tra le rilevazioni delle presenze e gli orari di lavoro degli addetti.
3. Rilevazione delle ore lavorate su commessa con sistema informatico che consenta la verifica automatica incrociando i dati delle presenze.
4. Rilevazione delle ore di lavoro sul macchinario 4.0 acquistato nel 2020 da ciascun operatore
5. La rilevazione dei tempi di lavoro deve includere la gestione del tempo di viaggio e delle prestazioni rese in trasferta.
6. La registrazione di presenze e ore lavorate su commessa deve poter avvenire con differenti dispositivi (PC, smartphone, tablet, PC 'chiosco' dedicato in officina, etc...) che potranno essere abilitati selettivamente per categorie di addetti.
7. La registrazione in officina deve essere il più simile possibile a come viene effettuata oggi, in modo da permettere il corretto passaggio alla nuova tecnologia.
8. Selezione rapida delle commesse direttamente dalla pagina di inserimento tempi.
9. Disallineamento controllato fra i tempi segnati su commessa e inseriti a report in busta paga, in modo da seguire l'attuale regime forfettario dei contratti, permettendo comunque un controllo accurato delle anomalie.

REIPILOGO GESTIONE PRESENZE DOPO INCONTRO DI ANALISI del 07/06/2022

La necessità primaria rilevata durante l'incontro del 07/06/2022 è quella di poter aumentare l'efficienza della produzione nei cantieri rilevando l'ingresso e l'uscita di tutto il personale, sia dipendente che esterno in tutte le sedi.

I Dipendenti appartengono a 2 società:

- Tecnologica
- Congenia

In base alle categorie di lavoratori le modalità di timbratura saranno diverse:

10. IMA: Impiegati ufficio → non possono timbrare utilizzando l'app, utilizzeranno esclusivamente l'applicazione windows installata sul proprio PC
11. IMT: Impiegati tecnici → utilizzeranno l'app con NFC per timbrare ingresso e uscita sia in ufficio che in cantiere

- 12. MO: Montatori di cantiere → potranno utilizzare l'app con NFC oppure l'interfaccia Web del software per timbrare ingresso e uscita
- 13. OP: Operai → potranno utilizzare l'app installata su un tablet oppure il tag NFC personale da passare sul lettore collegato al pc all'ingresso dell'officina

I Montatori di cantiere che non hanno l'app installata sul telefono si collegheranno ad una pagina web (attualmente non presente) dove dovranno eseguire l'accesso (utente e password) e selezionare entrata o uscita e il cantiere, che sarà da scegliere tra quelli localizzati nelle vicinanze, dovranno quindi avere il GPS acceso per poter effettuare la geolocalizzazione, che verrà utilizzata solo per trovare il cantiere.

In officina sarà presente il tag NFC da utilizzare per timbrare tramite app. Per il personale che non utilizzerà l'app verrà consegnato un TAG personale che, dopo aver selezionato entrata o uscita sul monitor touch, dovrà avvicinare al lettore NFC collegato al PC

Inoltre, il macchinario 4.0 acquistato nel 2021 avrà anch'esso un TAG NFC collegato in modo da poter rilevare le ore di utilizzo del macchinario e da qualche operatore viene utilizzato. Questi dati verranno elaborati dal software per avere un report giornaliero aggiornato con i dati dell'utilizzo della macchina.

Dovranno essere inseriti in anagrafica anche i consulenti esterni per poter consentire la timbratura.

Verrà inserito su ciascun mezzo un tag NFC, chi lo utilizza deve, tramite l'app, effettuare timbratura di ingresso e uscita, alla partenza e all'arrivo. In questo modo, oltre a monitorare la durata del viaggio si potrà risalire alla persona che stava guidando.

La timbratura da App e da applicazione windows è standard e già presente nel software.

ATTENZIONE: L'utilizzo dell'NFC su dispositivi Apple è supportato completamente dalla versione 14 di IOs e a partire da iPhone 7.

In anagrafica verranno salvati gli orari di lavoro di ciascun dipendente, ma non saranno previsti vincoli stringenti sull'effettivo ingresso\uscita.

Nella prima fase i dipendenti avranno configurato il proprio orario di lavoro, con il conteggio degli straordinari sempre abilitato (in questa fase i controlli non verranno fatti automaticamente)

Le regole di quadratura sono molto semplici, l'unico controllo che verrà fatto è che vengano "timbrate" il totale delle ore giornaliere da contratto (*ad esempio se l'orario è di 8 ore al giorno, vengono inseriti in automatico permessi\ferie solo se sono state timbrate meno di 8 ore in totale*).

Non c'è l'obbligo di una pausa pranzo minima.

Devono essere considerate tutte le timbrature senza considerare gli scarti di tempo tra timbrature diverse come assenze.

Ad esempio, il tecnico timbra quando sale in macchina per raggiungere il cantiere e timbra l'uscita all'arrivo, quando è in cantiere timbra l'ingresso fino al momento dell'uscita, in questo caso la quadratura sommerà le durate delle 2 timbrature senza segnare ferie e permessi per l'intervallo di tempo non compreso nelle timbrature. (*Viaggio: 08.00 - 08.35 / Cantiere 8.39 - 12.00 ➔ 3 ore e 56 minuti*)

Se richiesto, la differenza tra 2 timbrature, sotto una certa durata, configurabile, (*ad esempio 5 minuti*) potrà essere considerata come lavorata (*Ad esempio i 4 minuti dal parcheggio dell'auto alla timbratura all'ingresso del cantiere*).

I Dipendenti dovranno inserire autonomamente da programma Malattie, Infortuni, Maternità (compatibilmente con la capacità di utilizzare lo strumento).

Per le assenze dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione tramite il software e il responsabile potrà acconsentire o rifiutare.

Non sarà possibile gestire automaticamente l'iter della gestione delle buste paga (dalla timbratura alla generazione dei file da inviare all'azienda che si occupa di generare i cedolini) perché non abbiamo ancora ricevuto il tracciato del file da inviare e perché non ci sono state fornite le regole per calcolare straordinari\rimborsi spesa.

In questo momento vengono fatte a mano con regole diverse per ciascun dipendente; l'automatismo potrà essere implementato in una seconda fase quando ci verranno fornite tutte le informazioni.

SEDE

Verranno Gestite come sedi, anche i cantieri e gli automezzi.

Sarà necessario aggiungere i seguenti campi:

- Tipo Sede (SEDE PRINCIPALE, CANTIERE, AUTOMEZZO)
- Flag Attivo (da impostare a N quando un mezzo viene venduto\rottamato oppure quando il cantiere termina)

ANAGRAFICA

Sarà necessario aggiungere i seguenti campi:

- Codice Tag NFC Personale
- Qualifica Dipendente

Prevedere la creazione di stampe di controllo, non presenti attualmente, con l'indicazione delle ore da timbratura per Tipologia Sede\Addetto\Periodo ecc... ancora da definire nel dettaglio.

RIEPILOGO RENDICONTAZIONE COMMESSA DOPO INCONTRO DI ANALISI del 17/06/2022

REGISTRAZIONE ORE SU COMMESSA

Technologica utilizza il sistema Project Edilizia come strumento gestionale per la tenuta, fra l'altro, della contabilità analitica.

Su Project Edilizia sono presenti le anagrafiche delle Commesse, dei Clienti, degli Addetti, delle Voci di Costo.

Sono presenti altresì le registrazioni dei Costi dei Materiali e del Personale.

Flusso

In base agli accordi intercorsi il sistema integrato tra Project Edilizia e Si.Project avrà il seguente flusso di informazioni:

1. Project Edilizia esporrà le informazioni relative a Commesse, Clienti, Addetti, Qualifiche e Voci di Costo;
2. Si.Project acquisirà, tramite procedura da realizzare ad hoc, i dati sopra indicati;
3. Gli utenti di Si.Project utilizzando le diverse interfacce previste (desktop, web e mobile) compileranno i Timesheet relativi alle Commesse;
4. Gli utenti di Si.Project con apposite autorizzazioni potranno verificare le registrazioni degli addetti, eseguire rettifiche e approvare le registrazioni;
5. Si.Project esporrà i timesheet di Commessa;
6. Project Edilizia acquisirà le rendicontazioni.

Data Model

Vengono di seguito descritte le entità principali oggetto di sincronizzazione tra Si.Project e Project Edilizia. La sincronizzazione sarà bidirezionale (Si.Project acquisisce dati anagrafici da Project Edilizia quali Commesse, Addetti, etc.. e Project Edilizia acquisisce da SiProject le consuntivazioni).

Cantieri/Commesse

Project Edilizia => Si.Project

1. Codice (importiamo tutto il codice, visualizziamo le prime 3 cifre)
2. Descrizione Sintetica
3. Cliente
4. Località
5. Indirizzo
6. CAP
7. Provincia
8. CUP
9. CIG
10. Stato
11. Tecnico (referente)
12. ID TAG (presente solo su Si.Project) per identificare il cantiere

Tipi Attività (Voci di Spesa, per rendicontare su Commessa-Cantiere)

Project Edilizia => Si.Project

1. Id/Codice
2. Descrizione
3. Tipo (RM per manodopera, MEZZI per i costi KM gli automezzi)

Clienti

Project Edilizia => Si.Project

1. Codice
2. Nominativo

Addetti

Project Edilizia => Si.Project

1. Codice Dipendente (0 Tech - 1 Congenia)
2. Cognome e Nome
3. Matricola (per paghe)
4. Qualifica (Operaio, Montatore, Autista, Impiegato, etc...)
5. Flag 'Dip. Attivo'
6. Data Assunzione
7. Cellulare
8. Email
9. Codice Fiscale

Tecnici

Project Edilizia => Si.Project

1. Codice (non corrisponde al codice dipendente, va fatta una tabellina manutenibile)

2. Nominativo

Registrazioni Commessa

Si.Project => Project Edilizia

1. ID
2. Commessa
3. Tipo Attività
4. Addetto
5. Data
6. Numero Ore/Minuti
7. Automezzo (opzionale)
8. Km (opzionale)

Regole di Business

1. Le Commesse di Project Edilizia hanno uno Stato che identifica se la Commessa stessa è attiva; su Si.Project gli utenti 'base' potranno rendicontare solo su Commesse attive.
2. Le attività del personale vengono rese in Sede oppure Fuori Sede. Ogni Addetto ha associata una Qualifica (ruolo, mansione...). In funzione della Qualifica dell'Addetto e del Tipo di Sede sarà possibile utilizzare Tipi Attività differenti (detto in altro modo: su SiProject verrà gestita una tabella di configurazione dove per Qualifica/TipoSede verranno indicate le voci di Tipo Attività utilizzabili dagli addetti).
3. Solo alcune Categorie di Addetto (qualifiche) avranno facoltà di rendicontare le ore su Commessa (es. non gli impiegati amministrativi).
4. Nell'associazione di cui al punto precedente sarà possibile indicare una priorità delle voci di Tipo Attività per consentire un ordinamento diverso dall'ordinamento alfabetico (sarà possibile far comparire per prime le voci abituali).
5. Sarà possibile rendicontare le ore di viaggio utilizzando appositi Tipi Attività.
6. Nel caso in cui venga utilizzato un Mezzo l'utente conduttore del Mezzo dovrà utilizzare un apposito Tipo Attività (es. 'Viaggio Conducente') che consentirà di indicare qual è il mezzo e quanti sono i km percorsi.
7. Le voci di 'Viaggio' non di tipo 'Viaggio Conducente' non implicheranno l'inserimento del Mezzo.
8. Sulle Qualifiche (es. Operaio, Montatore, Progettista) potrà essere impostato un valore di default per indicare che la registrazione venga proposta all'utente come in Sede o Fuori Sede. L'utente potrà comunque eseguire la modifica del valore proposto.

9. Oltre agli Automezzi standard (costificati a KM) sono presenti anche Macchine da Cantiere (costificate a giorni); si potrebbe creare una funzione che consenta di registrare Commessa, Mezzo, Data Inizio, Data Fine per consentire l'invio all'analitica dei giorni di presenza del mezzo con controllo. Questa funzione sarà presente solo nell'applicazione gestionale-desktop e non nella mobile.
10. Le ore consuntivate vanno controllate (validate e rettificate). Solo le ore confermate verranno esposte verso Project Edilizia.
11. Il sistema conterrà una funzione per il controllo di congruenza tra le ore di Presenza e le ore rendicontate su Commessa. Sarà possibile visualizzare solo i record che contengono discrepanze, tutti i record, o un riepilogo per periodo (es. mensile). Durante le prime fasi del progetto verrà concordato un prototipo del report che verrà realizzato senza apportare modifiche tra la fine della progettazione e la consegna.
12. Il sistema consentirà di bloccare le rendicontazioni di commessa tranne che per gli utenti amministratori (es. blocco ad n giorni, blocco da utente Admin)

Out of Scope

Vengono di seguito riportate funzioni non comprese nella prima tranche dei lavori e da valutare a parte.

1. Mostrare nell'applicazione gestionale i dati di budget/consuntivo come da schermata dell'applicativo Project Edilizia cruscotto direzione (Cinzia ha inviato richiesta al fornitore sulla query)

Verifiche e appunti

1. Verifica dispositivi tablet con lettore NFC oppure NUC o schermo touch con lettore NFC esterno.
2. Verifica telefoni Android con display 'grande' 7"+
3. Issue: se si condivide il tablet per più persone e non si trova un tablet che legge i tag, c'è il problema dell'autenticazione.

Interfacce Utente

Saranno disponibili le seguenti interfacce utente, le versioni web e mobile avranno accesso a tutte le funzioni (tranne la lettura tag con NFC) dell'applicativo e sono pensate per gli utenti gestori del sistema e gli utenti degli uffici.

1. Web
2. Desktop (dagli uffici)
3. Mobile (anche in officina)

Dati presenti nella maschera

- ADDETTO (sola lettura, modificabile con login/logout)
- SEDE / FUORI SEDE (preimpostata)
- COMMESSA (INSERIMENTO CODICE, RICERCA)
- VOCE DI COSTO / ATTIVITA'
- NUMERO ORE (SI PUO' FRAZIONARE SOLO FINO ALLA MEZZORA, CON DROPDOWN)
- SE SCELGO TIPO DI ATTIVITA 'VIAGGIO CONDUCENTE' =>
 - AUTOMEZZO
 - KM

DOCUMENTI CONDIVISI

Il sistema conterrà una funzione che consentirà di pubblicare documenti e renderli disponibili al personale.

Il flusso sarà il seguente:

1. Sull'applicativo gestionale (Web e Desktop) gli utenti autorizzati potranno eseguire l'upload di documenti ed indicare a chi rendere disponibile il file (da definire se per utente o ruoli/qualifiche).
2. Gli utenti delle versioni mobile, web e desktop con opportune autorizzazioni potranno visualizzare l'elenco dei file condivisi.
3. Quando un nuovo documento verrà pubblicato l'utente riceverà notifica (verificare come, es. email, notifica mobile, etc...)

AVVISI

Il sistema conterrà una funzione che consentirà l'invio di notifiche al personale.

Il flusso sarà il seguente:

1. Sull'applicativo gestionale (Web e Desktop) gli utenti autorizzati potranno inserire un messaggio di notifica ed indicare a chi rendere disponibile il messaggio (da definire se per utente o ruoli/qualifiche).
2. Gli utenti della versione mobile riceveranno notifica sul device (n.b. la notifica verrà consegnata solo se l'applicazione sul dispositivo è autenticata sull'utente destinatario, vedere il caso dell'utilizzo condiviso dei dispositivi) e potranno visualizzare il messaggio.

PROPOSTA DI SOLUZIONE

SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONALE

Simatica Group è in grado di fornire la soluzione alle esigenze del committente avendo già realizzato una soluzione software fortemente personalizzabile e avendo già esperienza oltre ventennale negli specifici ambiti indicati nel presente documento.

Il progetto si articolerà in fasi di intervento definite secondo propedeuticità e priorità. Verranno descritti gli ambiti di intervento ritenuti prioritari e verranno altresì definite alcune estensioni possibili del sistema che si potranno valutare nel dettaglio al completamento del progetto.

FASI

Gli interventi previsti possono essere così identificati:

1. Analisi dei requisiti del sistema dai punti di vista funzionale, operativo e di sistema.
2. Implementazione del sistema software.
3. Distribuzione del sistema in ambiente di produzione, consulenza e assistenza all'avvio, formazione del personale.

1. ANALISI DEI REQUISITI DI DETTAGLIO DAI PUNTI DI VISTA FUNZIONALE, OPERATIVO E DI SISTEMA

OBIETTIVO

Identificare i requisiti funzionali, operativi e di sistema necessari alla progettazione del sistema secondo le necessità di Tecnologica.

Questa fase è propedeutica alla realizzazione delle fasi 2 e 3.

RISULTATI ATTESI

Formulazione di un documento di specifica dei requisiti ordinato per priorità e propedeuticità delle attività che consenta di circoscrivere l'ambito delle funzioni del nuovo sistema software e di formulare il cronoprogramma dei lavori.

La soluzione software oggetto dell'analisi sarà basata sulla personalizzazione e configurazione dei moduli Si.JobTime e Si.Project che sono stati visionati dal committente.

AZIONI

1. Definizione delle regole per la gestione della rilevazione presenze e assenze (presenze in sede, in trasferta, ritardi, richiesta ferie e permessi, orari di lavoro, quadratura, etc.) e di eventuali stampe personalizzabili.
2. Definizione delle informazioni necessarie per l'imputazione delle ore a commessa (attributi gestiti, eventuale budget di commessa, scomposizione della commessa, tipi di attività, etc.) e report di controllo e statistici.
3. Definizione dei flussi dati in input e output dal sistema da e verso sistemi gestionali esistenti quali ad esempio:
 - a. input da sistema gestionale di anagrafiche addetti, clienti, commesse, etc.
 - b. output registrazioni presenze/assenze verso sistema paghe
 - c. output registrazioni su commessa verso sistema gestionale
4. Definizione dei report di verifica per presenze-ore su commessa.
5. Definizione delle interfacce utente da configurare per le registrazioni presenze e commesse.
6. Definizione delle modalità per eseguire le registrazioni (utilizzo di tag NFC sui punti di rilevazione e/o per identificare gli addetti), e delle versioni da abilitare per classi di utenti (web/mobile/desktop).
7. Definizione delle registrazioni per i costi di trasferta (es. nota spese, diarie) per gestione rimborsi e imputazione sulle commesse.
8. Definizione delle modalità di condivisione dei documenti.
9. Definizione delle modalità di invio e ricezione degli avvisi.

TEAM COINVOLTO

Nome e Cognome	Funzione	Azienda	Mail
Paolo Cellarosi	Analista e PM	Simatica	paolo.cellarosi@simatica.it
Daniela Spighi	Responsabile di prodotto	Simatica	daniela.spighi@simatica.it
Cinzia Leoni	Responsabile del cliente	Technologica	Cinzia.leoni
DA DEFINIRE		Technologica	

OUTPUT

Progetto esecutivo.

2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE

OBIETTIVO

Realizzare le attività tecniche di personalizzazione dei moduli software come da documento di specifica.

RISULTATI ATTESI

La realizzazione del sistema coerente con le specifiche avverrà attraverso un processo incrementale e iterativo: a partire da due/tre settimane dall'inizio dei lavori verrà installato in un ambiente demo la prima versione del sistema con le configurazioni di base e ogni due settimane l'ambiente demo verrà aggiornato con le implementazioni realizzate. Le modifiche apportate verranno illustrate al cliente che potrà indicare le integrazioni e rettifiche necessarie purché coerenti con le specifiche concordate.

Al committente viene richiesto di nominare un responsabile interno del progetto che parteciperà agli incontri di presentazione delle novità, che sarà disponibile per fornire al team di sviluppo i chiarimenti necessari e che si impegnerà a verificare la soluzione in corso di realizzazione e comunicare tempestivamente le variazioni da apportare nel rispetto delle specifiche.

Le attività di configurazione del sistema che non richiedono attività di programmazione potranno venir svolte insieme ad un referente.

Per le attività di integrazione con il sistema gestionale esistente il committente si impegna a garantire la collaborazione del fornitore.

La versione demo sarà utilizzabile dal committente per le verifiche interne.

Il continuo dialogo tra Simatica Group e Tecnologica consentirà di procedere al miglioramento continuo della soluzione in fase di costruzione e avvicinarsi progressivamente al progetto finito riducendo il rischio di scostamento tra le attese e quanto realizzato.

Il prodotto di questa fase è il sistema applicativo completo di tutte le funzioni concordate pronto per l'inizio della distribuzione in produzione. In base alla nostra esperienza saranno necessarie alcune settimane dal completamento dello sviluppo all'entrata in produzione per stabilizzare il sistema e verificarlo con dati reali.

AZIONI

1. Sviluppo del software
2. Configurazione del software
3. Realizzazione delle interfacce di input e output
4. Test interno
5. Installazioni in ambiente demo
6. Presentazioni del sistema allo stato di avanzamento
7. Test del cliente
8. Implementazione rettifiche ed integrazioni richieste

TEAM COINVOLTO

Nome e Cognome	Funzione	Azienda	Mail
Paolo Cellarosi	Analista e PM	Simatica	paolo.cellarosi@simatica.it
Daniela Spighi	Responsabile di prodotto	Simatica	daniela.spighi@simatica.it
DA DEFINIRE	Responsabile dello sviluppo software	Simatica	
DA DEFINIRE	Responsabile del cliente		

OUTPUT

Software completo delle funzioni concordate comprese le interfacce di input e output.

3. DISTRIBUZIONE DEL SISTEMA IN AMBIENTE DI PRODUZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA ALL'AVVIO, FORMAZIONE DEL PERSONALE

OBIETTIVO

Distribuire il sistema a tutti gli utenti aziendali per i quali è previsto l'utilizzo assistendo il cliente nelle fasi di deploy della soluzione, agevolare l'adozione del sistema, formare il personale e garantire il regolare avvio.

RISULTATI ATTESI

Il sistema realizzato verrà distribuito agli utenti.

Nelle fasi di avvio verrà fornito il servizio di consulenza e affiancamento nella fase di avvio, il supporto di assistenza tecnica remota e on-site.

Verrà formato il personale.

Per le attività di integrazione con il sistema gestionale esistente il committente si impegna a garantire la collaborazione del fornitore.

La versione demo sarà utilizzabile dal committente per le verifiche interne.

Il continuo dialogo tra Simatica Group e Tecnologica consentirà di procedere al miglioramento continuo della soluzione in fase di costruzione e avvicinarsi progressivamente al progetto finito riducendo il rischio di scostamento tra le attese e quanto realizzato.

Il prodotto di questa fase è il sistema applicativo completo di tutte le funzioni concordate pronto per l'inizio della distribuzione in produzione. In base alla nostra esperienza saranno necessarie alcune settimane dal completamento dello sviluppo all'entrata in produzione per stabilizzare il sistema e verificarlo con dati reali.

AZIONI

1. Installazione del sistema sui sistemi interni o cloud
2. Installazione dei dispositivi e consegna delle istruzioni per installare nuovi client
3. Avvio del sistema con affiancamento degli utenti gestori del sistema
4. Consulenza sull'utilizzo per agevolare l'adozione del sistema
5. Attività di formazione del personale di ufficio e tecnico

TEAM COINVOLTO

Nome e Cognome	Funzione	Azienda	Mail
Paolo Cellarosi	Analista e PM	Simatica	paolo.cellarosi@simatica.it
Daniela Spighi	Responsabile di prodotto	Simatica	daniela.spighi@simatica.it
DA DEFINIRE	Responsabile dello sviluppo software	Simatica	
DA DEFINIRE	Responsabile del cliente		

OUTPUT

Software installato in ambiente di produzione, adozione del sistema da parte dell'organizzazione.

FINANZA AGEVOLATA

CREDITO D'IMPOSTA

1. BENI IMMATERIALI

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.

2. INNOVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE 4.0

Le misure di innovazione digitale e formazione 4.0 permettono un recupero fino al 40% del costo dei dipendenti per le ore impiegate sul progetto di innovazione digitale. Questo contributo è indipendente dal costo del software stesso.

FONDO PERDUTO

Ogni anno in Italia escono centinaia di bandi con contributo a fondo perduto.

La digitalizzazione è la seconda voce di spesa in assoluto più finanziata, sia dai bandi ciclici che dai bandi PNRR, in particolare quando si tratta di innovazioni 4.0 (come in questo caso).

Un esempio di bando ciclico – di uscita annuale – è il voucher per Industria 4.0 della camera di commercio della Romagna che finanzia 10.000 euro a fondo perduto su 20.000 euro di spesa.

Il contributo è cumulabile con il credito d'imposta.

PROIEZIONE INVESTIMENTI E RECUPERI:

FINANZA AGEVOLATA

Se decideste di fare anche la finanza agevolata con Simatica, i potenziali costi sarebbero:

Investimento in Finanza Agevolata: **2.500 euro**, compresi:

- Piano transizione 4.0 2022 beni materiali e immateriali
- Piano transizione 4.0 2022 progetto di innovazione digitale e bonus formazione 4.0

Altri progetti presentati a fondo perduto verranno quotati singolarmente. Il servizio di monitoraggio bandi verrà effettuato gratuitamente.

SOFTWARE

Per completare lo sviluppo ed installazione del progetto come descritto in questo documento, l'investimento viene valutato a **30.000 euro**. (1.600 per analisi e 28.400 per sviluppo, configurazione, consulenza e formazione)

Il costo comprende:

- **Modulo Si.Project**
- **Modulo Si.JobTime**

Ed un lavoro di personalizzazione e consulenza stimato a:

- **4 Giornate** di analisi
- **43 Giornate** di sviluppi e personalizzazioni software
- **4 Giornate** di configurazione
- **6 Giornate** di consulenza per startup
- **1 Giornata di formazione**

Il costo ed i tempi definitivi verranno consegnati insieme all'analisi completa al seguito delle 4 giornate.

Simulazione di recupero con **32.500 euro** di investimento in software e finanza agevolata per 4.0 (queste sono stime, il recupero reale si vedrà solo dopo aver sostenuto le spese e impostato i requisiti per bonus formazione 4.0)

Beni Immateriali 4.0: 50%

$$32.500/2 = \underline{\underline{16.250}}$$

$$\text{Consulenze Cinzia: } 10.000/2 = \underline{\underline{5.000}}$$

Bonus Formazione 4.0: 35%

Il Bonus Formazione è sempre cumulabile perché non dipende dal costo del bene, ma dal costo dei dipendenti.

50 dipendenti: esempio con 14 amministrativi/uffici + 22 tecnici

Costo amministrativo medio: 22 euro/ora. Formazione 64 ore.

Costo tecnico medio: 20 euro/ora. Formazione 16 ore.

Totale: $(22 \times 20 \times 16 \times 0,35) + (14 \times 22 \times 64 \times 0,35) = 2.464 + 6.899 = \underline{\underline{9.363}}$

Voucher CCIAA Romagna 2023: (ipotesi basata su storicità del bando)

Fondo perduto di **10.000 euro**

Totale nel migliore dei casi:

Spesa (Software+ finanza agevolata): 32.500

Recupero: $10.000 + 16.250 + 9.363 + 5.000 = \underline{\underline{40.613}}$


Totale solo con credito d'imposta:

Spesa: 32.500

Recupero: $15.000 + 9.363 + 5.000 = \underline{\underline{30.613}}$

CRONOPROGRAMMA (INDICATIVO):

ID	Fase	Data Inizio	Durata	Data Fine	Responsabile	Milest one
1	Analisi dei requisiti	25-lug	14	08/08/2022	Paolo Cellarosi	1
1.1	Documento di progetto in bozza	25-lug	7	01/08/2022		
1.2	Progetto definitivo	1-ago	7	08/08/2022		
2	Modulo Rilevazione Presenze	22-ago	60	21/10/2022		1
2.1	Consegna 1	22-ago	14	05/09/2022		
2.2	Consegna 2	5-set	14	19/09/2022		
2.3	Consegna 3	19-set	18	07/10/2022		
3	Modulo Rendicontazione Commesse	22-ago	60	21/10/2022		1
3.1	Consegna 1	22-ago	14	05/09/2022		
3.2	Consegna 2	5-set	14	19/09/2022		
3.3	Consegna 3	19-set	17	06/10/2022		
4	Deploy server, configurazione e stabilizzazione	7-ott	30	06/11/2022		1
4.1	Installazione e configurazione server e applicativi	7-ott	4	11/10/2022		
4.2	Affiancamento e avvio rilevazione presenze	12-ott	10	22/10/2022		
4.3	Affiancamento e avvio rendicontazione	17-ott	10	27/10/2022		
4.4	Collaudi	25-ott	10	04/11/2022		
5	Deploy client e formazione utenti	7-nov	14	21/11/2022		1
5.1	Installazione client	7-nov	5	12/11/2022		
5.2	Formazione addetti	11-nov	10	21/11/2022		

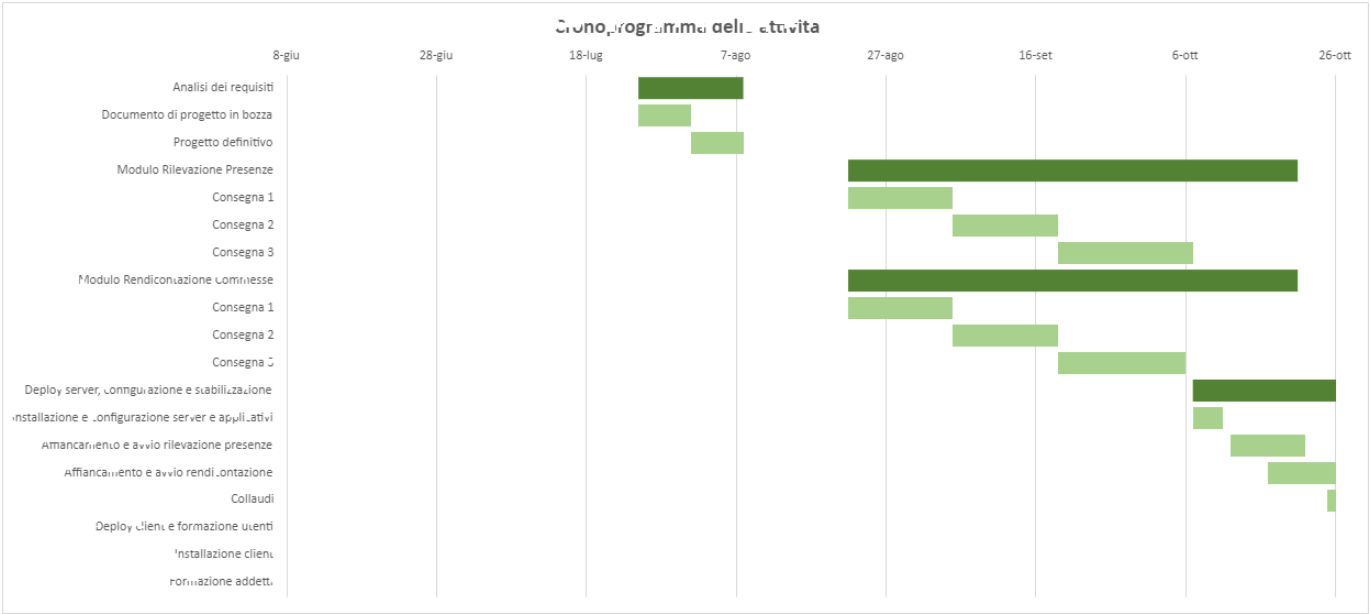

Il cronoprogramma definitivo verrà consegnato al termine della fase di analisi.

Firma per accettazione dei requisiti tecnici come da presente analisi

Luogo e data

Firma cliente

Timbro e firma

Firma fornitore

Timbro e firma
